


Практическая работа

Разработка плана внедрения программного обеспечения

- определение целей внедрения
- план внедрения и его содержимое
- основные этапы работ
- оценка сроков выполнения



Формат работы: сначала пример с разбором, затем индивидуальное задание.

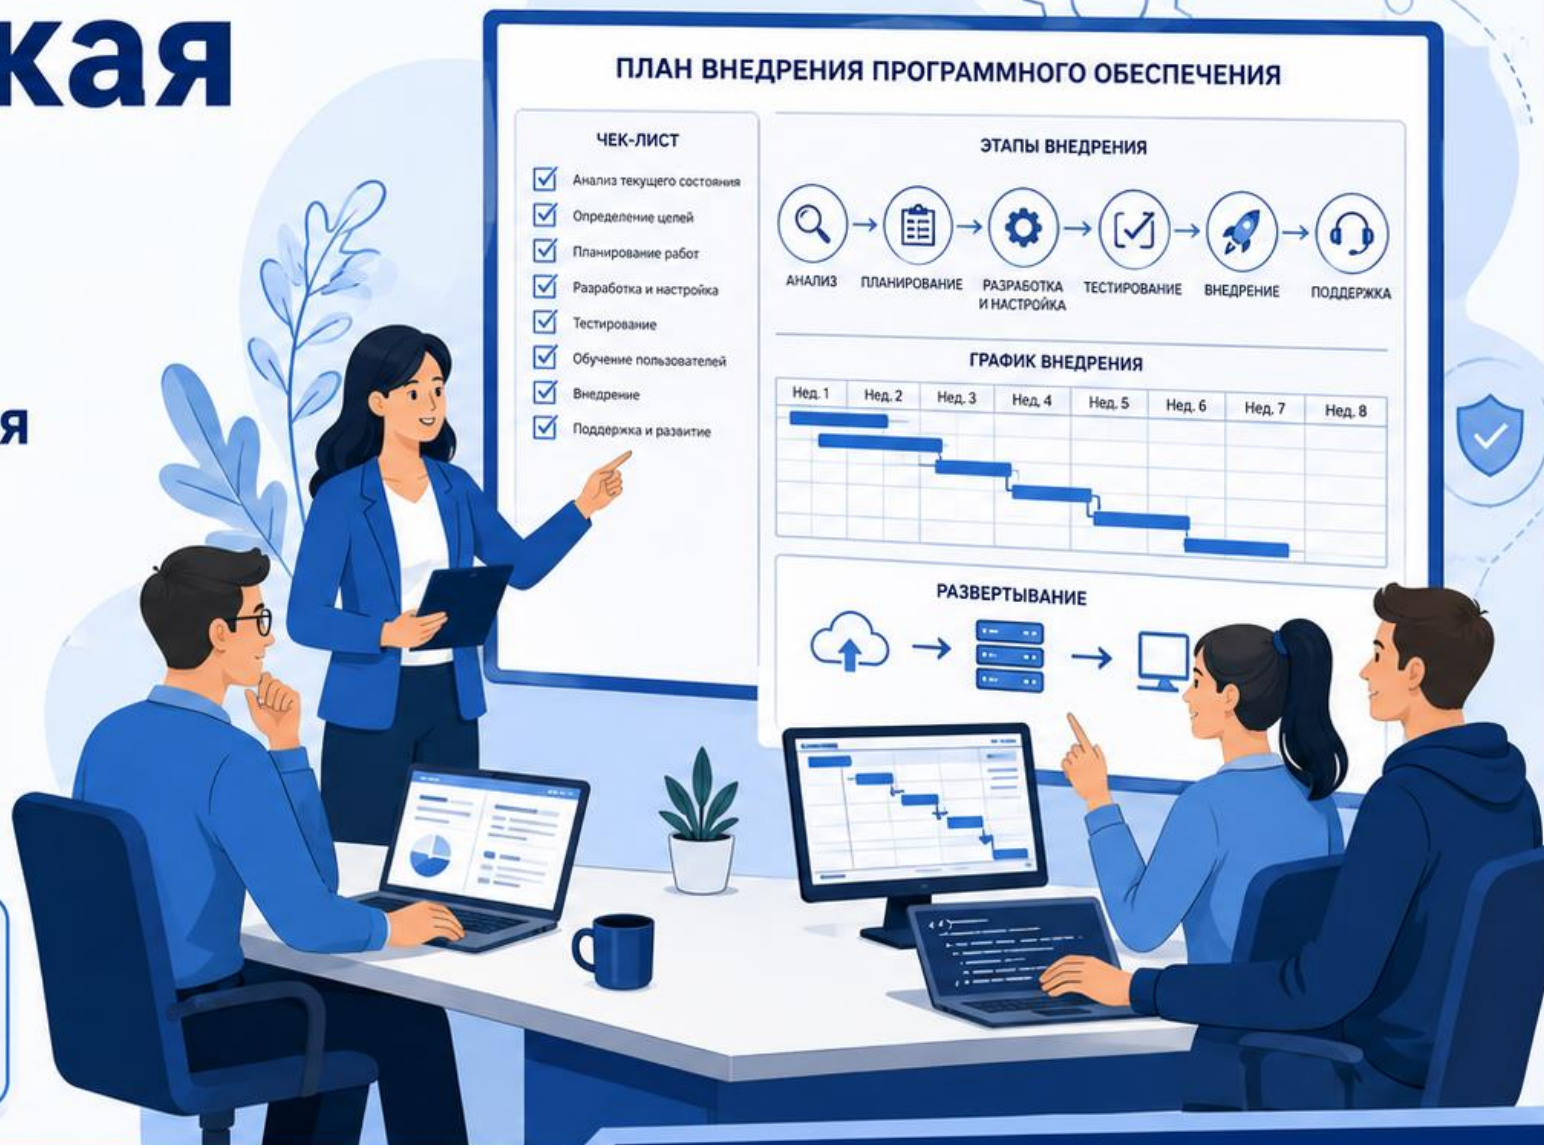

Цель и ожидаемые результаты

Цель практической работы:

- научиться разрабатывать план внедрения ПО
- определять цели внедрения
- выделять основные этапы работ
- оценивать сроки выполнения

Результат:

- готовый проект плана внедрения
- график этапов работ
- обоснование сроков



Студент должен уметь связать цели, этапы и сроки внедрения.



Пример с разбором

Исходная ситуация

Колледж внедряет «Электронную систему учёта заявок в IT-отдел».



Проблема:

- обращения фиксируются вручную
- Долго распределяются заявки
- Нет единой истории обращений
- Сложно контролировать сроки исполнения



Задача внедрения:

Необходимо подготовить план внедрения системы, которая позволит регистрировать, назначать и отслеживать заявки пользователей.



Далее рассмотрим пример пошагово.



Шаг 1. Определение целей внедрения



Для нашего примера цели внедрения:

- ускорить обработку заявок пользователей
- обеспечить единый учёт обращений
- снизить вероятность потери заявок
- повысить прозрачность работы IT-отдела
- сформировать отчётность по обращениям



Цели должны быть конкретными, понятными и измеримыми.

БИЗНЕС-ЦЕЛИ



ЧТО МЫ ХОТИМ ДОСТИЧЬ

- ☒ Ускорить обработку заявок пользователей
- ☒ Обеспечить единый учёт обращений
- ☒ Снизить вероятность потери заявок
- ☒ Повысить прозрачность работы IT-отдела
- ☒ Сформировать отчётность по обращениям



ИЗМЕРЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ И УЛУЧШАЕМ ПРОЦЕССЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ



ПАНЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

ID	Статус	Заявка	Приоритет
#1258	Новая	●	Высокий
#1257	В работе	●	Средний
#1256	Решена	●	Низкий
#1255	Новая	●	Средний
...			

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Сокращение времени обработки



Единый учёт обращений



Меньше потерянных заявок



Прозрачность и отчётность

Шаг 2. План внедрения и его содержимое



План должен содержать:

- цели и ожидаемые результаты
- перечень этапов работ
- ответственных исполнителей
- необходимые ресурсы
- сроки выполнения
- риски и меры контроля
- критерии успешного завершения



Чем подробнее составлен план, тем легче организовать внедрение.

ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ



ЦЕЛИ



КОМАНДА



РЕСУРСЫ



СРОКИ (ТАЙМЛАЙН)



РИСКИ И МЕРЫ КОНТРОЛЯ



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ


Шаг 3. Основные этапы работ при внедрении



- каждый этап должен иметь результат
- между этапами проводится контроль
- часть работ может выполняться параллельно



Итог: поэтапное внедрение снижает риски и обеспечивает достижение целей проекта.

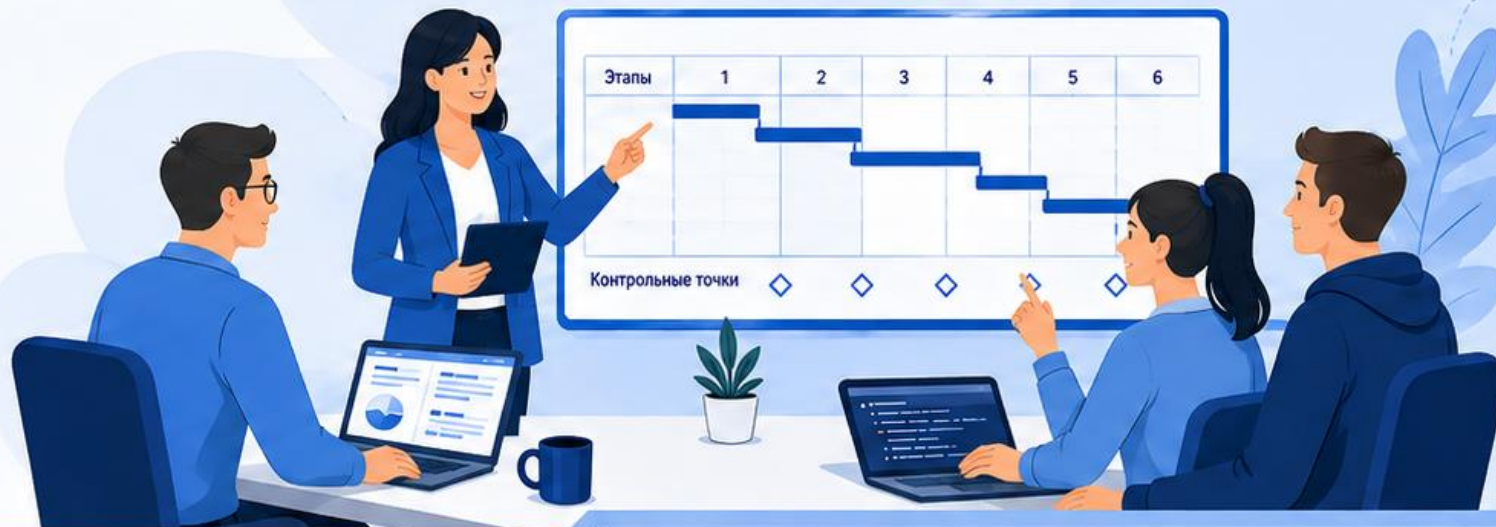

Шаг 4.

Оценка сроков выполнения работ

- сроки зависят от объёма работ
- учитываются ресурсы и занятость сотрудников
- необходимо предусмотреть резерв времени
- сроки удобно оформлять в виде календарного плана

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА (ПРИМЕР)

Этапы работ	Дни проекта														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Анализ требований — 3 дня	■	■	■												
Подготовка оборудования — 2 дня				■	■										
Установка и настройка — 4 дня						■	■	■	■						
Тестирование — 3 дня										■	■	■			
Обучение пользователей — 2 дня													■	■	
Запуск системы — 1 день															■



Итого: 15 рабочих дней



Итог примера: готовый краткий план



Объект внедрения:
система учёта заявок IT-отдела



Цели:
ускорение обработки обращений,
единый учёт, контроль сроков



Срок выполнения:
15 рабочих дней



Ответственные:
руководитель проекта, системный
администратор, специалист поддержки



Так оформляется пример решения с разбором.

Этап	Содержание работ	Результат	Срок
1 Анализ	Сбор требований, анализ текущего процесса, формирование задачи	Требования и план работ	2 дня
2 Подготовка	Подготовка окружения, данных и инфраструктуры	Готовая среда для внедрения	2 дня
3 Настройка	Настройка системы, ролей, прав доступа и уведомлений	Настроенная система	5 дней
4 Тестирование	Проверка функций, сценариев и интеграций	Отчёт о тестировании и исправления	2 дня
5 Обучение	Обучение пользователей, инструкции и материалы	Обученные пользователи	2 дня
6 Запуск	Переход в продуктив, поддержка на начальном этапе	Система в работе, стабильная работа	2 дня

Индивидуальное задание



Разработайте собственный план внедрения программного обеспечения для одной из ситуаций:

- 1 Электронный журнал
- 2 Система учёта книг в библиотеке
- 3 Программа складского учёта
- 4 Система регистрации обращений пользователей

В работе необходимо:

- определить цели внедрения
- составить план и его содержимое
- выделить основные этапы
- оценить сроки выполнения
- указать ответственных и ресурсы

Выберите вариант и разработайте план внедрения

1



Электронный журнал

2



Система учёта книг в библиотеке

3




Программа складского учёта

4



Система регистрации обращений пользователей

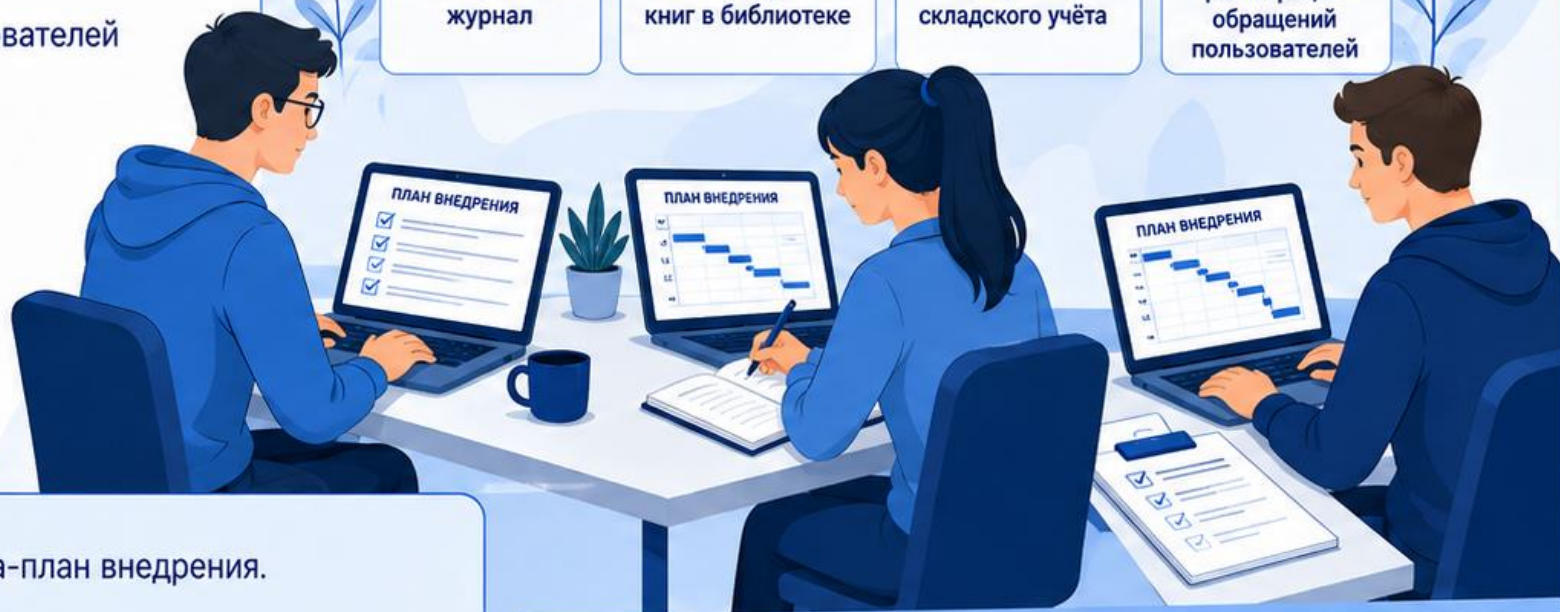

Форма результата: 1–2 слайда или таблица-план внедрения.
